



Aktuelle Entwicklungen

20.09.2018 in Saarbrücken


EDV-Gerichtstag

Johannes Jahrbeck
Simon Melcher

- Programmleitung -




Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 3. Derzeitiger Programmstatus
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 



Agenda

1. **Programmhistorie und Entwicklung**
 2. **Umfang und Organisation**
 3. **Derzeitiger Programmstatus**
 4. **Aktuelle Planungen**
 5. **Ermittlung des Funktionsumfangs**
 6. **Präsentation Design-Prototyp**
- 

Kurze Historie des Programms gefa

Seit Anfang 2018:
Tatsächliche Umsetzung der
Verbunderweiterung.

Ende 2017:
Beschlüsse zur Abtrennung
Modernisierung fS-Text.

20.10.2017:
Erste Sitzung des
Programmlenkungsausschusses gefa.

29.03.2017 Beschluss eJustice-Rat:
Entwicklung eines gemeinsamen
Fachverfahrens durch alle 16 Länder.

Sept. & Nov. 2016:
Beschlüsse zur Aufnahme von
Verhandlungen zur Zusammenarbeit
aller 16 Länder.

Scope: • Nur noch Fachverfahren;
weitere Umsysteme anzubinden.
• Zusätzlich: Staatsanwaltschaften,
Fachgerichte
Erfahrungshintergrund:
Nunmehr forumSTAR, Judica, Eureka, Mesta,
web.sta, Eureka-Fach, ...

20.05.2015:
Beschlussfassung
Modernisierung
forumSTAR
&
forumSTAR-TXT.


01.08.2015:
Programm Modernisierung fS
und fS-TXT aufgesetzt.

Scope: Fachverfahren ordentliche Gerichtsbarkeit und Textsystem
Erfahrungshintergrund: forumSTAR

Ursprüngliche Systemabgrenzung


Projektzuständigkeiten für die Modernisierung forumSTAR

Bis Mitte/Ende 2017

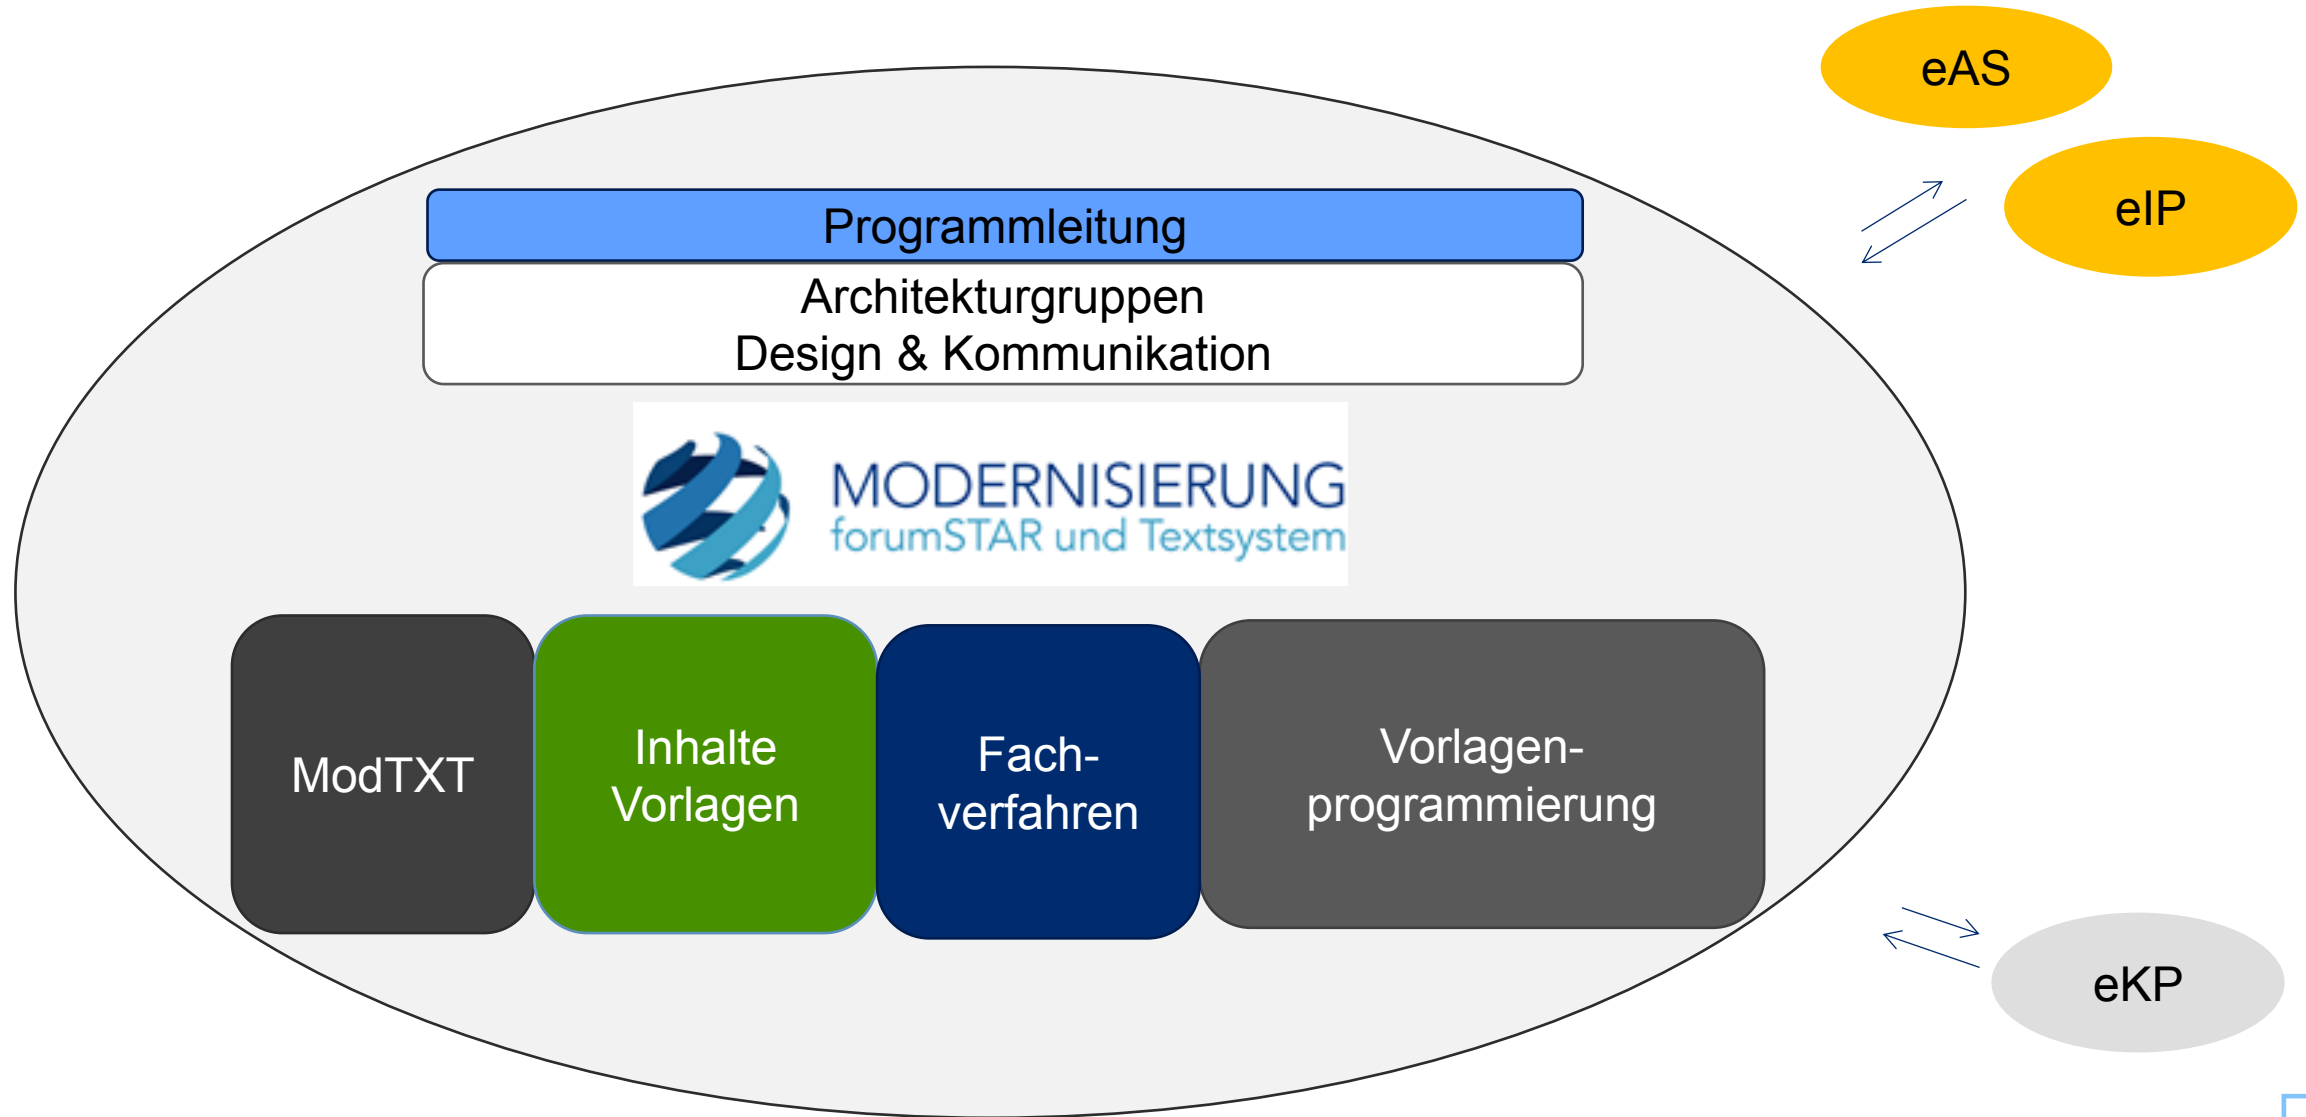


Aktuelle Systemabgrenzung

Projektzuständigkeiten für gefa und „Umsysteme“




Seit Ende 2017

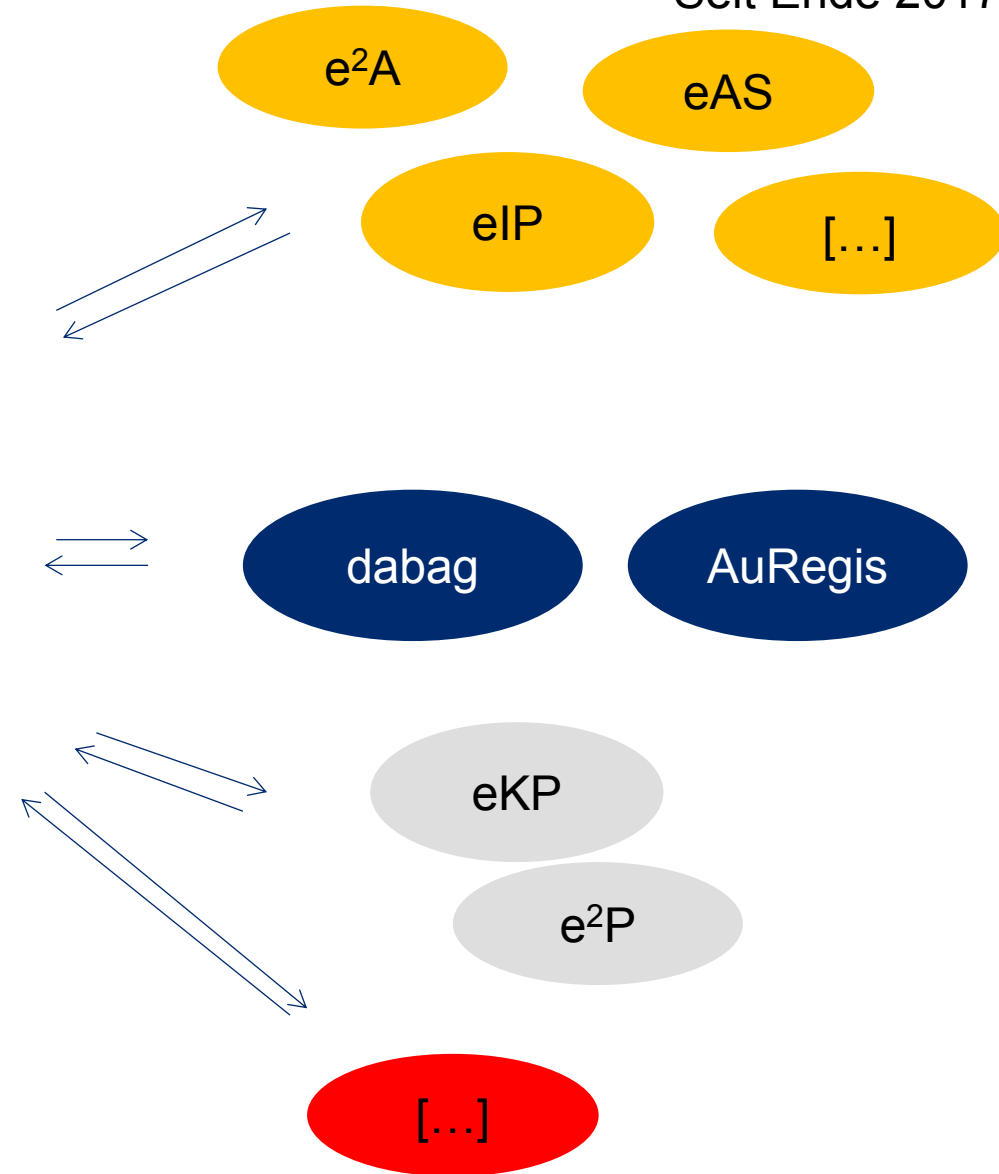


















Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 3. Derzeitiger Programmstatus
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 

Größenordnung des Programms

Prognostizierte Anwenderzahlen


																			
		BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH		
Gerichte	Anzahl Gerichte	127	102	11	29	5	10	54	26	94	151	57	12	31	30	27	28	Anzahl Gerichte insg.	794
	ForumSTAR	7000	8800	3500	2650		1400		2600			4060		2800		2600	1900	Nutzer	70210
	JUDICA										14000								
	EUREKA					700		8300		7200			800		1900				
Anzahl Staatsanwaltschaften		19	25	3	7	2	2	13	5	14	19	10	2	6	5	5	5	Anzahl StAs insgesamt:	142
StA	WEB-STA	1850	2500			200				2000		870	200	1000	580		500	Nutzer	19520
	MESTA			1400	680		600	1600	400		4500					640			
Fachgerichte		angefragt	1960	700	angefragt	150	angefragt	1300	angefragt	angefragt	3090	600	150	800	470	500	430	Anzahl Nutzer FGs insgesamt:	10150
Summe Anwender		8850	13260	5600	3330	1050	2000	11200	3000	9200	21590	5530	1150	4600	2950	3740	2830	Summe Nutzer insgesamt ca.:	99880

Personalplanung

Aktueller Überblick über den Stand der Personalgestellung durch die Länder (Stand: 10.09.2018)

Land	BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Summe:	Ziel
Königstein	12,96662	15,53327	5,08324	3,03655	0,95331	2,55752	7,39885	2,0124	9,33138	21,14424	4,83089	1,21111	5,05577	2,79941	3,39074	2,6947	100	
Soll	7,8	9,3	3,0	1,8	0,6	1,5	4,4	1,2	5,6	12,7	2,9	0,7	3,0	1,7	2,0	1,6	60,0	60
Ist	5,75	8,25	3,5	0,5	0,6	1	4,5	1,25	6,85	8	2	0,7	4,5	1,7	2	1	52,1	
Differenz	-2,0	-1,1	0,5	-1,3	0,0	-0,5	0,1	0,0	1,3	-4,7	-0,9	0,0	1,5	0,0	0,0	-0,6	-7,9	

Verteilung AKA-Anteile auf benannte Mitarbeiter*innen

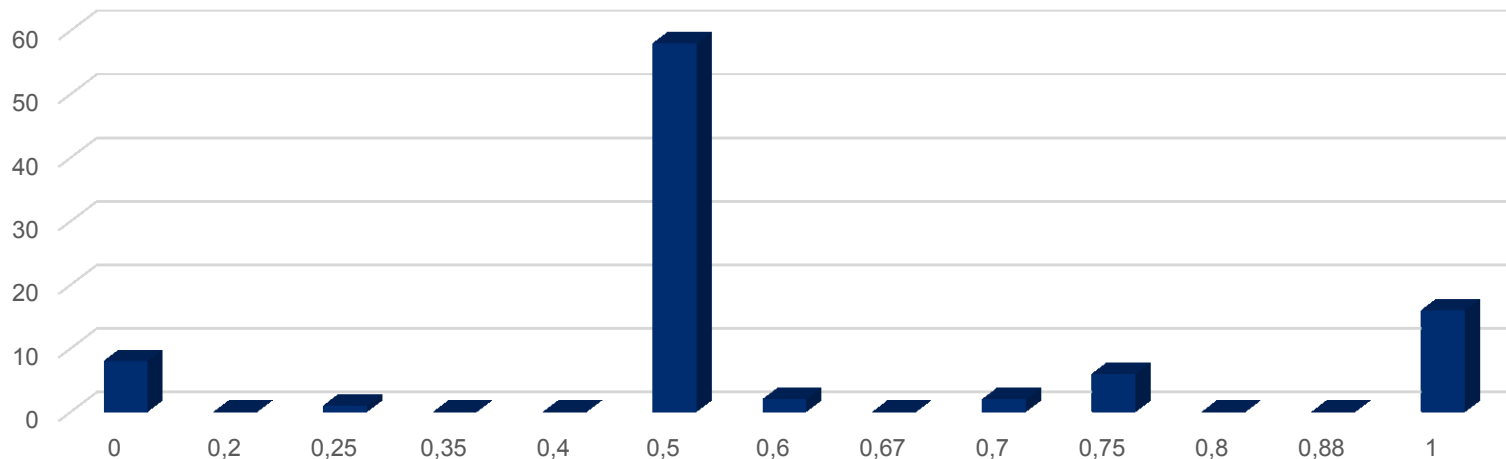


$$\Sigma = 93 \text{ Personen}$$

$$\emptyset = 0,57 \text{ AKA}$$

Organisation des Programms

Übersicht Zuständigkeiten, Programmaufbau und Hierarchien

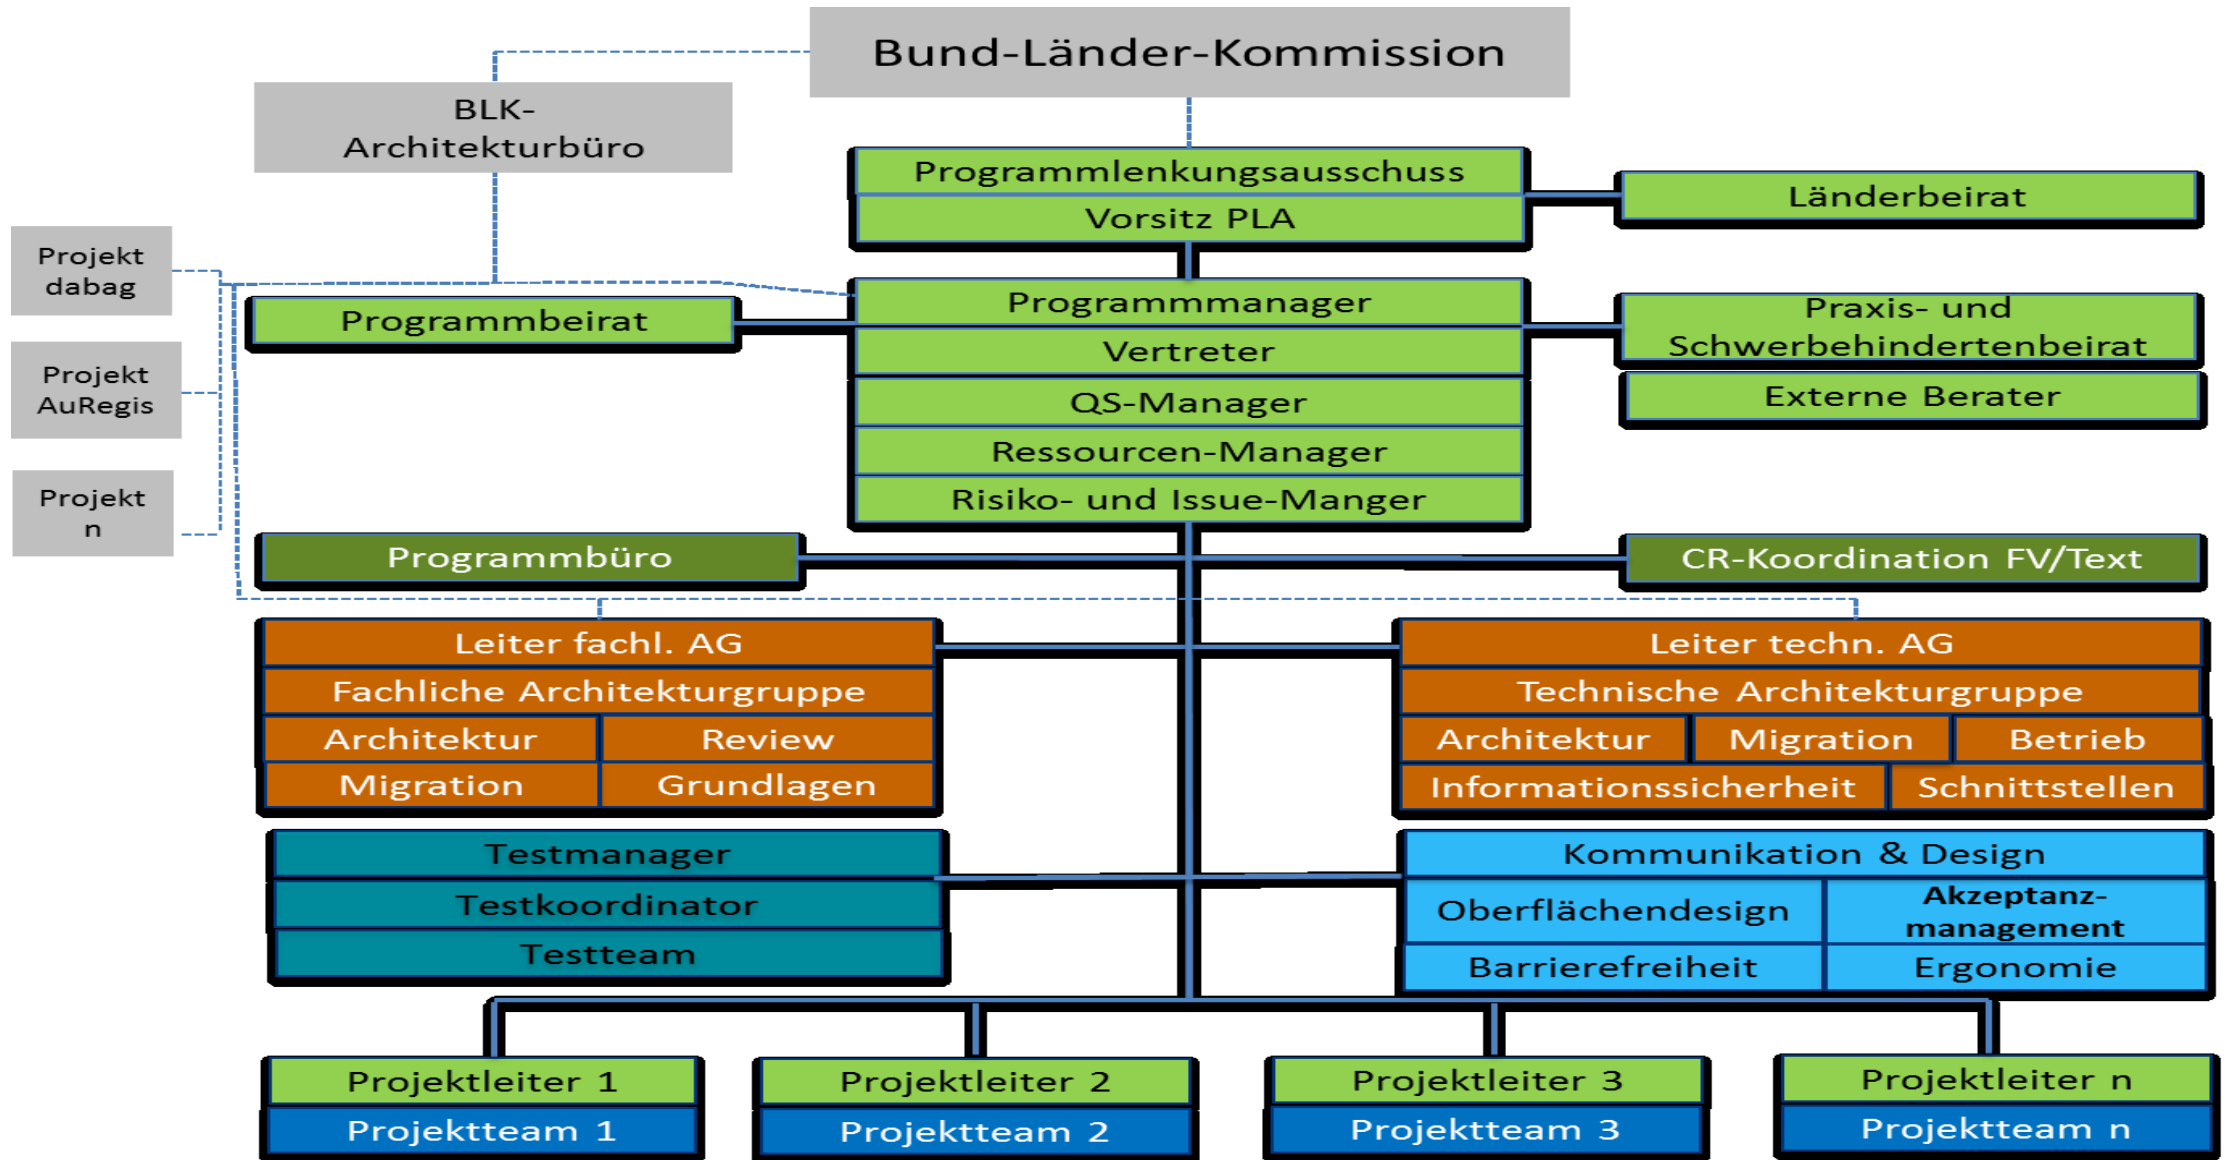



Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 - 3. Derzeitiger Programmstatus**
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 

Programmstatus gefa

Überblick und Ergebnisse

Vergabe Entwicklung gefa wurde initiiert (Deadline: März 2021):

LB f. Unterstützungsleistungen LB-Erstellung wird gemeinsam mit Fa. Infora erarbeitet.

Auf der PLA-Sitzung vom 05.09.2018 wurde die Gesamtplanung unter Berücksichtigung auch des Vergabeverfahrens hinsichtlich der Entwicklerleistungen aktualisiert (siehe Punkt 4).

Die Projekte ERV- Komponente, Verfahrensverwaltung und Kalender/Termine/Räume befinden sich in der Umsetzungsphase.


Auslieferung eines ersten Releases ist derzeit für 17.10.2018 geplant.

Gemäß Beschluss des PLA vom 05.09.2018 soll die Entwicklung der Kalenderkomponente eine Integration von e²S beinhalten (hinsichtlich Sitzungssaalaushang und Raumverwaltung).

Projekt Datenschutz (auch DSGVO) hat Arbeit aufgenommen.

Projekt Straf hat Arbeit aufgenommen. Sinnvolle Zusammenarbeit mit Verfahrensverbänden muss etabliert werden.

Schulungen von Programmmitarbeitern werden durchgeführt (aktuell finden zur Anforderungserhebung 3 Schulungstermine statt).



Derzeit laufende Projekte

Umsetzungsphase

KTR

Kalender/Termine/Räume

ERV-

Komponente

VFVW

Verfahrensverwaltung

Laufende bzw. derzeit anlaufende Projekte

Konzeptionsphase bzw. Vorgabenerarbeitung für andere Projekte

Personenverwaltung

Gerichtsverwaltung

Statistik

Kosten

Berechtigung

Zivil

Straf/StA

Admin statische
Daten


Modellierung

Datenschutz

Hilfe




Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 3. Derzeitiger Programmstatus
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 

Planung

Aktuelle Planung gemäß Beschluss des PLA vom 05.09.2018

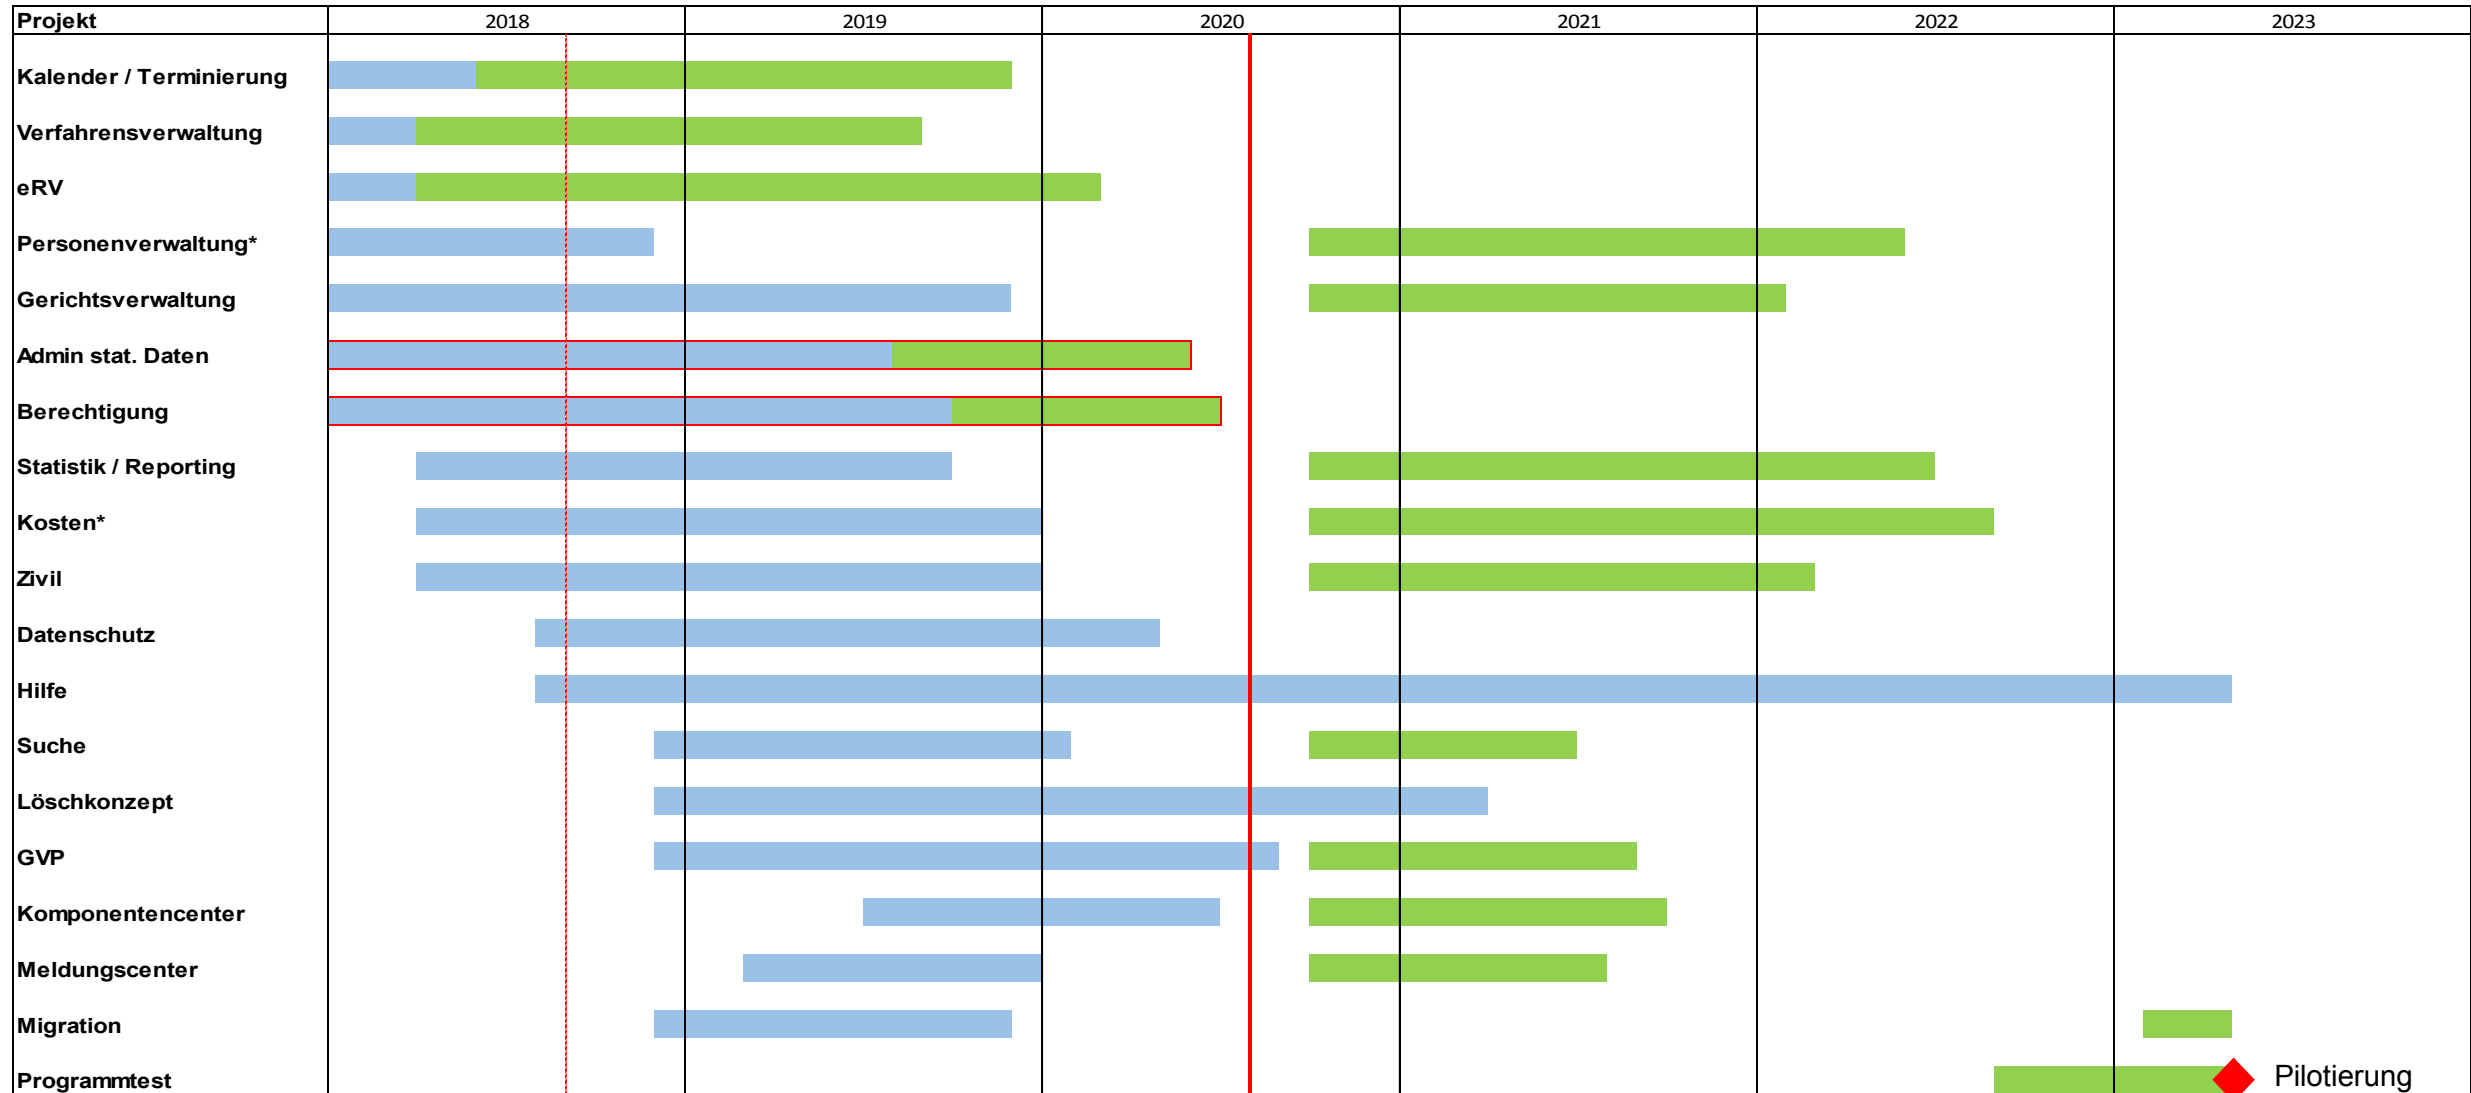

* doppeltes Sprintteam

heute

Zuschlagserteilung


Konzeption

Umsetzung

Pilotierung
Zivil 05/2023
wie Szenario 2
gemäß EVOR

Planung

Aktuelle Planung gemäß Beschluss des PLA vom 05.09.2018

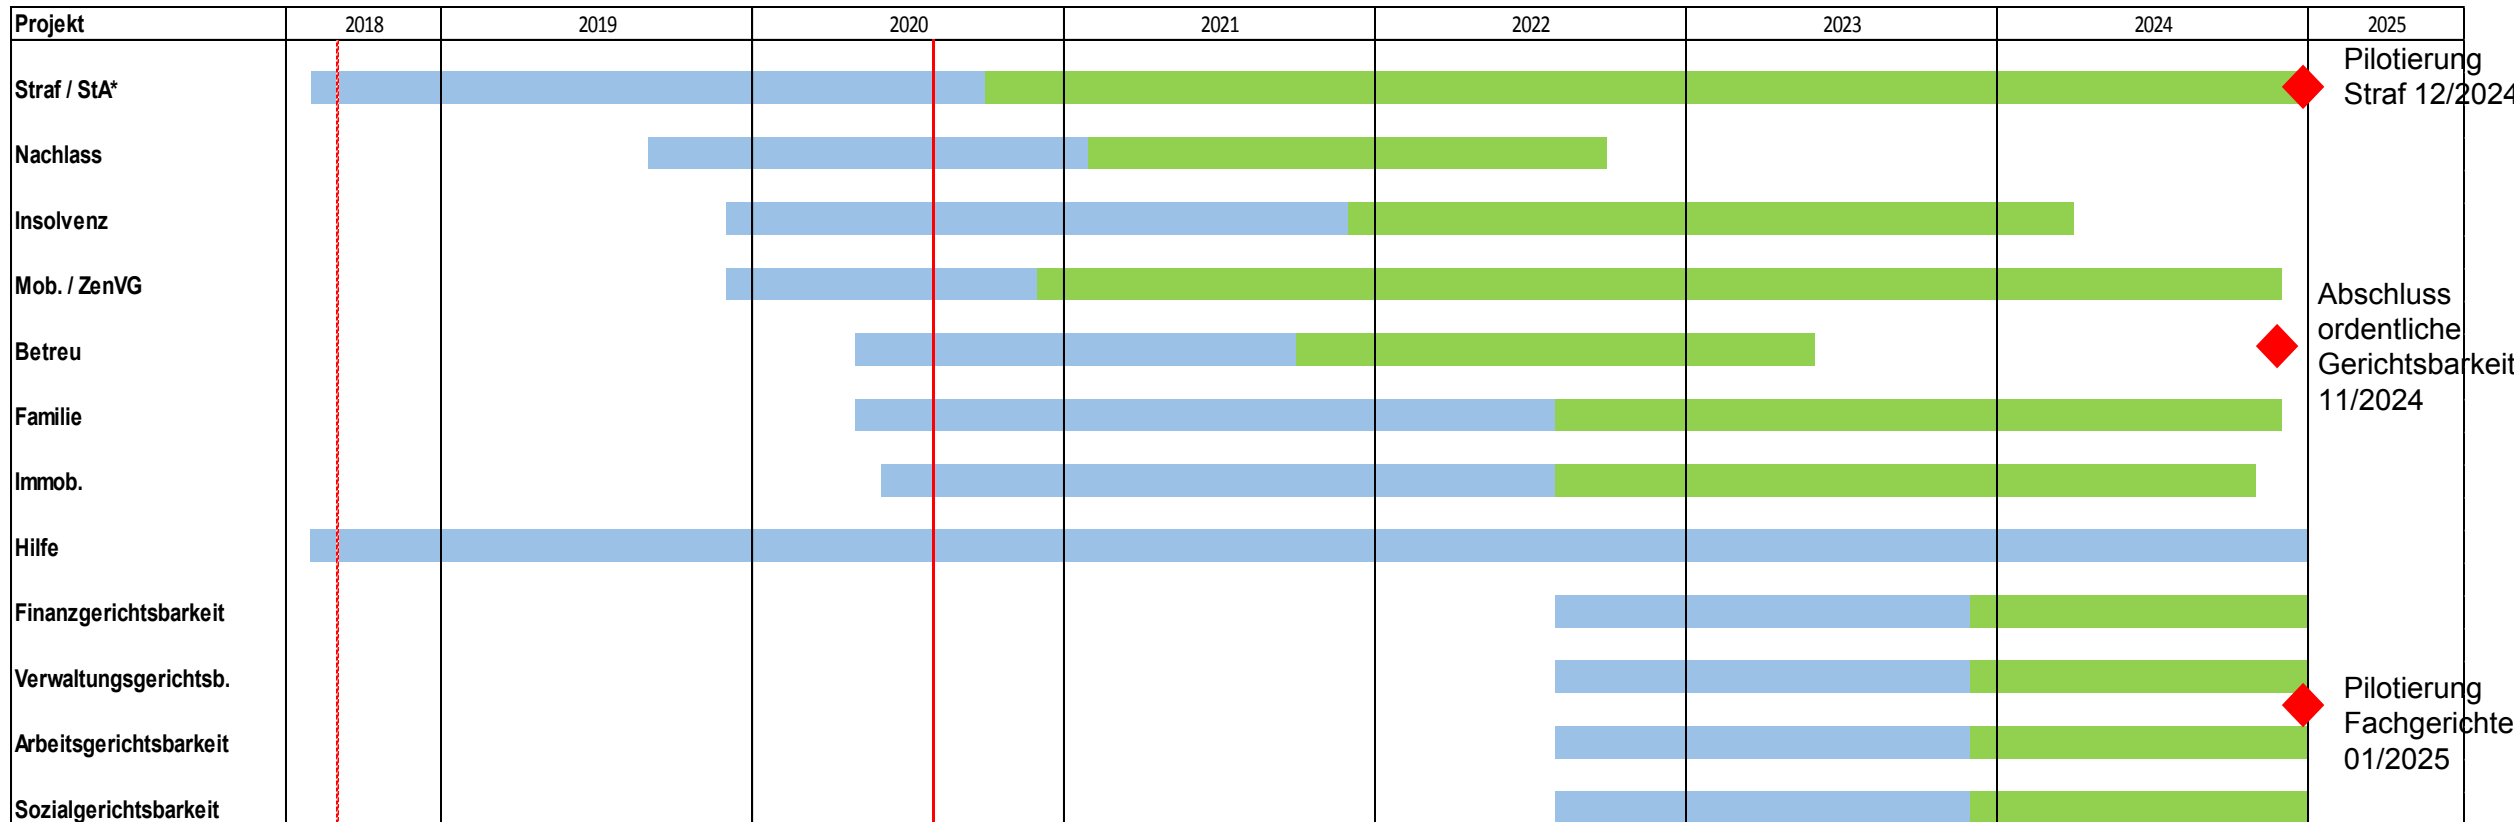

* doppeltes Sprintteam

heute

Zuschlagserteilung

Konzeption


Umsetzung (hier jeweils inkl. Migration und Programmtest)

Hinweis:

Die Planung der Reihenfolge der weiteren Fachaufsätze der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaft und der Fachgerichte ist vorläufig. Insoweit sind noch weitere Erhebungen, Bewertungen und ggf. Nachplanungen erforderlich.



Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 3. Derzeitiger Programmstatus
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 

Abstimmung umzusetzender Anforderungen mit den Fachverfahrenverbänden

Abfrage aller
Funktionalitäten der
Bestandsverfahren

Alle Verbände abzulösender Verfahren werden in standardisierter Form um Darstellung des aktuellen und benötigten Funktionsumfangs der Bestandsverfahren gebeten.

Konsolidierung

Die fachliche Architekturgruppe im Programm gefa führt die Funktionsbeschreibungen zusammen, vergleicht diese und macht einen Vorschlag, welche Funktionalitäten umgesetzt werden sollen.

PLA

Die Gegenüberstellung von Abfrageergebnis und beabsichtigter Umsetzung wird dem PLA zur Genehmigung vorgelegt.



Der fachliche Scope des gefa steht fest und kann als Grundlage für Planung und Komponentenschnitt dienen.

Abstimmung umzusetzender Anforderungen mit den Fachverfahrenverbänden

Basis: Abbild der Bestandsverfahren = abgeglichenes Abfrageergebnis



was ist umzusetzen



wie ist umzusetzen



Basis: Projektarbeit bzw. Erfahrungswissen = bestehendes Vorgehen & Zusammenarbeit mit den Verfahrenverbänden





Agenda

1. Programmhistorie und Entwicklung
 2. Umfang und Organisation
 3. Derzeitiger Programmstatus
 4. Aktuelle Planungen
 5. Ermittlung des Funktionsumfangs
 6. Präsentation Design-Prototyp
- 



Johannes Jahrbeck, johannes.jahrbeck@jus-it.bayern.de – 089/5597-1656

Simon Melcher, simon.melcher@itd.nrw.de – 0271/3373-972
